

Program 2. delavnice za pisanje prijav

Program		
Trajanje	Naslov sklopa	Nosilec sklopa
08.30 – 09.00	Registracija udeležencev in pogostitev s kavo	Špela Žohar, Janja Samec
09.00 – 09.30	Nagovor direktorice, pregled pretekle delavnice	Tanja Bolte, Julijana Lebez Lozej
09.30 – 11.00	Prenos rezultatov projekta v aktivnosti	Danilo Šteblaj, Irena Likar
11.00 – 11.15	Odmor	Gostinstvo Femec
11.15 – 13.15	EU dodana vrednost	Janja Samec, Irena Likar
13.15 – 14.00	Kosilo	Gostinstvo Femec
14.00 – 15.00	Tveganja in njihovo naslavljanje	Marjetka Šemrl dos Reis, Irena Likar
15.00 – 15.10	Zaključek	Julijana Lebez Lozej





LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR



Prenos rezultatov projekta v aktivnosti

Danilo Šteblaj

Ljubljana, 19. in 22.3. 2018

Vsebina sklopa:

- **Pričakovani rezultati projekta**

- **Tipi akcij**

- **Vsebina in povezovanje akcij**

- **Prenos informacij v prijavnico**



Kako si lažje zapomnimo ta sklop?

$$3 + 5 = 8$$



Pričakovani rezultati projekta

Morajo biti konkretni, realistični in merljivi



Pričakovani rezultati projekta

(zmanjšanje na 25 ton CO₂/leto, povečanje habitata na 3,3 hektarja visokega barja, zmanjšana povprečna poraba vode za 17 m³/leto/stanovanje)

Kazalniki uspešnosti !

Izhodiščno stanje

(40 ton CO₂/leto, 2 hektarja visokega barja, povprečna poraba vode 80 m³/leto/stanovanje)

Že pri načrtovanju rezultatov morate razmisliti, kako boste zagotovili:



Ponovljivost



Prenosljivost



Trajnost

Do pričakovanih rezultatov projekta pridemo preko akcij. Akcije morajo biti upravičene.

Na kaj odgovorjamo pri akcijah?

Zakaj?

Kako?

Kdaj?

Stroški?

Kaj?

Kje?

Kdo?

Povezanost?



Česa ne smemo pozabiti?



in



Mejniki („Milestones“) so pomembni ali večji dogodki tekom projekta.
Primer: otvoritev informacijskega centra, vzpostavitev spletne strani

Izdelki („Deliverables“) so končni otipljivi rezultati projektnih aktivnosti, ki jih je potrebno dostaviti evropski komisiji.
Primer: promocijski material, načrt upravljanja

Prenos v prijavnico

LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

- A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
- B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights
- C. Conservation actions
 - C1 C1
- D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
- E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
- F. Project management (obligatory)



Sklop: Prenos rezultatov projekta v aktivnosti

C. Conservation actions

ACTION C.1: C1

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

Beneficiary responsible for implementation:

Assumptions related to major costs of the action:

C1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name	Deadline
------------------	----------

C1's PROJECT MILESTONES

Milestone name	Deadline
----------------	----------



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR





LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR



Prenos rezultatov projekta v aktivnosti- Izkušnje iz prakse

Irena Likar

Ljubljana, 19. in 22.3. 2018

Sklop: Prenos rezultatov projekta v aktivnosti

LIFE16 NAT/SI/000708 - CO

- Ključni korak snovanja projekta
- Izhajati iz zelenih rezultatov ali ciljev projekta
- Projektna akcija običajno vsebuje več aktivnosti na podlagi katerih se nato vrednoti stroške projekta
- Upoštevati sklope akcij
- Ne pozabite na obvezne akcije ali aktivnosti!
- PREDLOG: NE izpolnjujete prijavnice preden niso akcije dokončno definirane
- Pri definiranju akcij sodelujte s partnerji in določite odgovornosti za izvedbo, PREDLOG: NARIŠITE SI!

LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

- A1 Ugotavljanje habitatne rabe prednostne kvalifikacijske vrste bobnarica (*Botaurus stellaris*) kot osnova za pripravo načrta vzpostavitve mirm cone
- A2 Načrt vzpostavitve in smernice za upravljanje mirm cone za bobnarico (*Botaurus stellaris*)
- A3 Izdelava projektov za preusmerjanje obiskovalcev od območja mirm cone za bobnarico (*Botaurus stellaris*)
- A4 Izdelava CGP, procesnega in komunikacijskega načrta projekta

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

- B1 Odkup zemljišč za izvedbo renaturacije vodotoka Stržen
- B2 Odkup zemljišča za postavitev omitološke opozovalnice

C. Conservation actions

- C1 Pripravljalna dela renaturacije vodotoka Stržen
- C2 Odlov rib iz odseka vodotoka Stržen - območja gradbenih del
- C3 Obnova vodotoka Stržen - zemeljska dela
- C4 Obnova vodotoka Stržen - zaključna dela
- C5 Vzpostavitev mirm cone za bobnarico (*Botaurus stellaris*)
- C6 Vzpostavitev infrastrukture na Cerknškem jezeru z namenom preusmerjanja obiskovalcev od najboljčutljivejših delov projektnega območja
- C7 Aktivnosti preusmerjanja obiskovalcev iz najboljčutljivejših delov zavarovanega območja

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

- D1 Merjenje učinkov konkretnih projektnih akcij
- D2 Študija z oceno socio-ekonomskega vpliva projekta LIFE STRŽEN na lokalno prebivalstvo in gospodarstvo
- D3 Merjenje obnove delovanja ekosistema

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

- E1 Promocija projekta z namenom ozaveščanja širše javnosti
- E2 Mreženje in diseminacija rezultatov projekta
- E3 Ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu projekta za lokalno skupnost

F. Project management (obligatory)

- F1 Vodenje projekta
- F2 Projektni svet deležnikov
- F3 Revizija projekta
- F4 LIFE po LIFE-u



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR



Pripravila: Irena Likar


2017

2018

PRI PRAVLJ. DELA

- DOSTOP. POTI
1.9.2018 - 30.11.2018

DOSTOP?

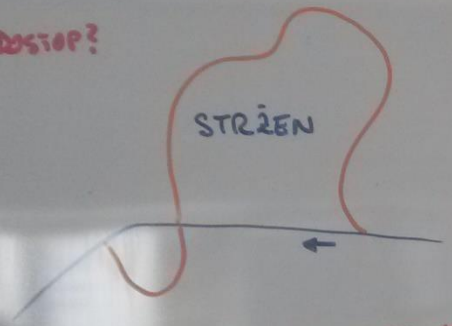

ZAČ. STANJE → TEHNOLOGIJA?

POŠTE-OLJNA-OLJANJE

- kaj boljšine?
- NEPRISILJENOST!!!
- stroški depozij?
- stroški nafte?
- stroški parkovskih plačil?
- zaloge?
- umiki v ESSA podoben?
- (DEŽURSTVO 1/2?)

TEREN: RAZTEPE

- dostopi?
- neovirnost
- lastnost: motivacija
- transport
- rač. depozij - neovirnost
- ...

ČAS ZAČI 1 mesec??

- organizacija
- zmogljivost/načinov. /okup
- št. strojev...
- ...
- ...

SE TO SPLOU DA
MIT ZA "TA" DEJAV?
OKRIBU?


2019

ZETTELJEN DELA

1.8.2019 - 31.8.2019

31 mesec!!!

VNOS 1.110...
JEDELO, HIMA...
KAI ZA S POTI...



gradnja

Dobro stanje
(UTOPILNO??)


KOLIKO DEJAVNI? (KOP?) (ČENA?)

obnov ?
viškov
stavbine
(umirila!!)
45.000 m²??

TEHNOLOGIJA :

- rač. depozij } travstrel?
- traj. depozij }
- odliv / zasip stroje?
- z "BLATON" - konsolidacija?
- zabijanje bit. pilotov sredi stroje?
- (strojeb?)
- UČINKOVITOST → ČAS IZVORJE

DEMOLIRJI




"VRETEANJE" TVEGANJE/TVEGANJA:
- KAJ ČE NEBO "KOPANJE" SREDI DEL:
- TVE. ZA ČAS. DEMOLIRANJE
- TVE. DA UNJE KONTAT DEL. IN DEL!

KAKO MOŽE BODO
REŠEVANJA (VRETEANJE) + Unik!

KAKO ZAVRŠITI, DA
SREČAMO ČRANJE
GRAD. TEH. AVIACIJE?
KAI = BOSTON "KOPANJE"?

če bo puščilo → 2020
(izbrzo)
se postavi... →

KAJ PA RAVNANJE?
FLEXIBILNOST MARIČNIA PODVIRALCEV?



KOLIKO STANJE

Sklop: Prenos rezultatov projekta v aktivnosti

LIFE16 NAT/SI/000708 - C1c

C. Conservation actions

ACTION C.2: Odlov rib iz odseka vodotoka Stržen - območja gradbenih del

Description and methods employed (what, how, where, when and why):

Kaj? Območje renaturacije oziroma odsek vodotoka Stržen, kjer se bodo izvajala gradbena dela (akcija C3), se bo na zgornji in spodnji meji omejil z zapornimi mrežami, s čimer bo ribam med izvajanjem renaturacije preprečen dostop do območja gradbenih posegov. Upravljalec zgornjega dela vodotoka Stržen je ZZRS. Pod njihovo upravljanje sodi tudi odsek predviden za renaturacijo, zato bodo odgovorni za izvedbo te akcije. Spodnji del vodotoka Stržen je pod upravljanjem Ribiške družine Cerknica (RD Cerknica), ki izvedbo renaturacije podpira (obrazec A8). ZZRS bo ribe, ki bodo pri umestitvi mrež zajete med postavljeni mreži, s pomočjo NRP, ZRSVN in zunanega izvajalca izlovil v največji možni meri in jih prestavil gorvodno, v ohranjeno strugo. S tem bomo preprečili njihov pogin, zaradi predvidenih gradbenih del. Po izvedeni renaturaciji vodotoka Stržen (akcija C3), bo ZZRS zaporne mreže odstranil.

Kako? ZZRS bo pred pričetkom izvajanja gradbenih del v strugi (akcija C3), z mrežami zamejil območje dela odseka Stržena, kjer se bodo izvajala gradbena dela (Karta). Sledil bo izlov rib zagrajenega odseka. Pri izlovu mora zaradi širine struge (20 m) po metodologiji sodelovati vsaj 15 oseb. ZZRS toliko osebja ne more zagotoviti, zato bo NRP v izvajanje te akcije povabil Ribiško družino Cerknica, ki upravlja z dolvodnim delom Stržena in je za delo usposobljena in ustrezno opremljena. Stroški so opredeljeni v kategoriji zunanjih izvajalcev. Postopek zelenega javnega naročanja (direktno naročilo) bo pripravil NRP (1 oseba x 1 dan x 2 leti). Pri izlovu bo poleg ZZRS (4 osebe x 2 dni/leto x 2 leti) sodeloval tudi NRP (2 osebi x 2 dni/leto x 2 leti), ZRSVN (2 osebi x 2 dni/leto x 2 leti) in izbran zunanji izvajalec.

Za izlov rib bo uporabljena metoda elektroribolova s čolna. Postopoma, protitočno se bo z elektriko omamljalo ribe, jih s saki polovilo in z vedri nosilo v kontejnerje za shranjevanje in transport rib. Ko si bodo izlovljene ribe po elektrošoku popolnoma opomogle, se jih bo spustilo v višje ležeči predel vodotoka Stržen, na območje, ki ne bo pod vplivom gradbenih del. Morebitne izlovljene tujerodne vrste rib bomo iz vodotoka odstranili. Odpeljala jih bo brezplačna Veterinarsko higijska služba. V času izlova bo ZZRS vse ribe tudi popisal in izmeril (2 osebi x 3 dni) ter na podlagi dobljenih podatkov pripravil končno poročilo o izlovu (1 oseba x 5 dni).

Kje? Zaporne mreže se bo postavilo na dveh lokacijah, ki bosta omejili območje renaturacije. Izlov rib bo potekal, na z mrežami omejenem odseku vodotoka Stržen, ki se nahaja v osrednjem območju Cerknškega jezera, znotraj dveh Natura 2000 območij (SI5000015 in SI3000232) (Karta).

Kdaj? Čas izlova rib je vezan na čas pričetka zemeljskih del renaturacije (akcija C3). Odlov rib bo izveden v letu 2018, ko bo Hidrotehnik pričel s pripravljalnimi deli renaturacije (akcija C1) in v letu 2019, tik pred pričetkom zemeljskih del renaturacije (akcija C3).

Zakaj? Izlov rib je nujno potreben, da se zaradi izvajanja gradbenih del v strugi vodotoka Stržen (akcija C3), prepreči njihov pogin. Druge vrste, v obdobju predvidenem za izvedbo renaturacije, niso ogrožene.

Beneficiary responsible for implementation:

ZZRS

ZRSVN in NRP bosta ZZRS asistirala pri izlovu rib (prenašanje rib z vedri, pisanje zapisnika ipd.). NRP bo zadolžen tudi za izvedbo zelenega javnega naročila za izbor zunanega izvajalca, ki je potreben zaradi obsega izlova, ki po metodologiji zahteva vsaj 15 usposobljenih oseb.

Assumptions related to major costs of the action:

Page 114 of 228

LIFE16 NAT/SI/000708 - C1c

Strošek osebja je preračunan v skladu s sistemizacijo javnih uslužbencev po katalogu javnih uslužbencev za osebe javnega prava ter v skladu z analizami stroškov osebja in notranjo sistemizacijo delovnih mest partnerja NRP. Ocena stroškov dela izhaja iz analiz porabe časa na predhodnih projektih (LIFE WETMAN, LIFE KOČEVSKO, LIFE LIVEDRAVA). Vsako akcijo smo na principu metode projektnega managementa za vrednotenje osebja - metode RBS razčlenili na aktivnosti najnižjega nivoja in ocenili potrebno osebje za njihovo izvedbo. Izračun je priložen (Priloga 16 - zavihek C2).

Potni stroški so izračunani na podlagi veljavne zakonodaje, podrobnejših notranjih aktov organizacij in izračunanih razdalj relacij v akciji. Odlov rib bo potrebno narediti v čim krajšem možnem času in sklenjeno. Zato je za ekipo sodelujočih v tej akciji s strani ZZRS-ja predvideno prenočevanje na območju Cerknice. Stroški so ovrednoteni na podlagi ponudnikov nočitev na Notranjskem.

ZZRS je ocenil stroške opreme na podlagi pridobljenih ponudb.

NRP bo izbral zunanega izvajalca. Predvideva se vključiti RD Cerknica, zaradi usposobljenosti članov društva in opremljenosti. Ovrednoteni stroški za odlov so ocenjeni na podlagi povpraševanja.

- Povezujte akcije, povezujte z grožnjami/problematiko
- Izvedbo opredelite čim bolj natančno, predlagam s številom osebja



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR



Pripravila: Irena Likar

DELO V SKUPINAH

50 MINUT

