



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR



Druga delavnica za pripravo prijav

Ljubljana, 12. in 13. februar 2019



LIFE14 CAP/SI/000012



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR



Prenos rezultatov projekta v aktivnosti- Izkušnje iz prakse


dr. Nika Debeljak

Ljubljana, 12. in 13. februar 2019



Izkušnje projekta

„Ohranjanje in upravljanje suhih travnišč vzhodne Slovenije“

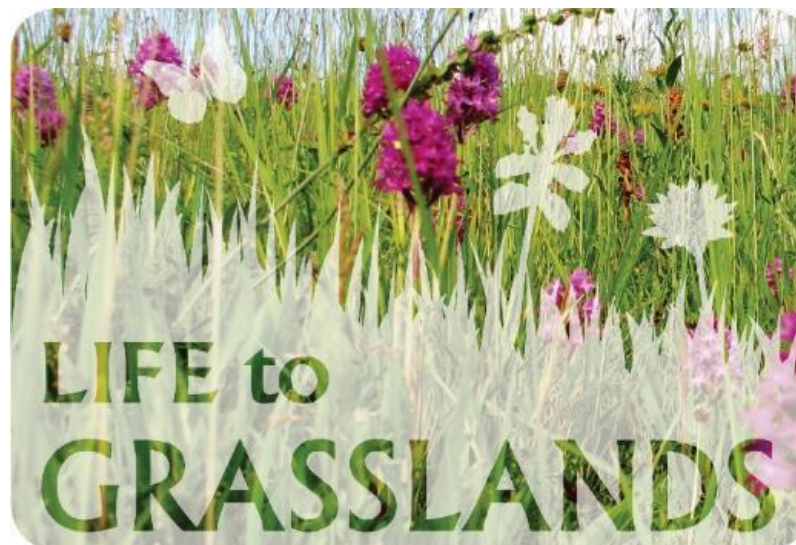

Nika Debeljak
Ljubljana, 12.-13.2.2019

Definiranje cilja in aktivnosti

Izboljšanje stanje ohranjenosti ter zagotavljanje trajnostnega dolgoročnega upravljanja 2 prioriternih tipov suhih travišč v 6 Natura 2000 območjih

Grožnje

Okoljske

- Opuščanje rabe / zaraščanje
- Intenzivna raba
- Eutrofikacija
- Erozija na velikih naklonih
- Propadanja travniških sadovnjakov

Socialno demografske

- Lastniška razdrobljenost zemljišča
- Visok starost prebivalstva
- Nizka ozaveščenost o pomenu travišč

Aktivnosti

- Odstranjevanje zarasti
- Vzpostavitev ekstenzivne paše
- Vzpostavitev ekstenzivne košnje
- Revitalizacija tradicionalnih sadovnjakov
- Odkup zemljišč
- Povezovanje lastnikov, kmetov in najemnikov – skupna raba opreme, portal
- Priprava predloga KOPOP
- Povečanje donosnosti kmetij – blagovna znamka
- Povečanje ozaveščenosti o pomenu ohranjanja travišč deležnikov



Prenos rezultatov v aktivnosti

Akcija = sklop aktivnosti

Kaj potrebujemo za izvedbo

Časovno zaporedje ter povezljivost aktivnosti

Delitev aktivnosti med partnerji

Definicija odgovornega nosilca akcije



LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

- A1 Analysis of the initial situation of the agricultural use of dry grasslands
- A2 Elaboration of the Conservation guidelines for sustainable management of HT 6210(*) / 6230(*) in the project sub-areas
- A3 Involvement of landowners in the project and identification of areas for action implementation
- A4 Permit procedures

Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights

- B1 Purchase and lease of land in the Haloze project sub-area
- B2 Purchase of land in Gorjanci-Radoha project sub-area

Concrete conservation actions

- C1 Removal of overgrowth
- C2 Ensuring the appropriate long-term use of dry grasslands
- C3 The restoration and maintenance of traditional orchards
- C4 Networking of owners and users of dry grassland plots in the Haloze project sub-area
- C5 Preparation of farm management plans for improving dry grasslands management
- C6 Preparation of an Expert Proposal of AEP measures related to the preservation of the HT 6210(*) and 6230(*) for integration into Rural development programme of the Republic of Slovenia
- C7 Development and Economics study of Dry Grasslands Preservation in the Haloze project sub-area

Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

- D1 Monitoring of the impact of project actions success
- D2 Assessment of the socio-economic impact and ecosystem functions restoration

Public awareness and dissemination of results (obligatory)

- E1 National and local authority education and information project
- E2 General public and local community awareness campaign
- E3 Promotion material
- E4 Information and interpretation tools
- E5 The project's web page and project graphic identity
- E6 Grassland classroom
- E7 Equipment for setting up project info rooms in Haloze, Pohorje, Gorjanci-Radoha and Kum project sub- areas
- E8 Layman's report

Project management and monitoring of project progress (obligatory)

- F1 Project co-ordination and management
- F2 Networking with other projects
- F3 Audit
- F4 After-life conservation plan

Prenos rezultatov v aktivnosti

Akcija C.2 – Zagotavljanje dolgoročnega upravljanja

Rezultat:

- 517 ha v trajnostnem upravljanju do 2025

Aktivnosti:

- Zagotavljanje paše: 94km ograje; neodplačana raba pašne opreme: koli, žica, pašni aparati, napajalniki....
- Zagotavljanje košnje: skupna neodplačana raba gorskih kosilnic, mučerja, račnih kosilnic...
